



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

- প্রকল্পের নাম : পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
- বাস্তবায়ন মেয়াদ : জানুয়ারী ২০১৯ -জুন ২০২৫
- মোট বরাদ্দ : ৪,৫১৬.৭৫ কোটি টাকা

ক। প্রকল্পের সমাপ্ত অঙ্গসমূহঃ

- ১০০ মিটার সার্ভিস জেটি ও জেটি সংযোগ সড়ক (৭০০ মিটার)।
- সিকিউরিটি ফেন্সিং নির্মাণ।
- ওয়ার্ক বোট ক্রয় (২টি)
- পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট নির্মাণ
- (৪+২ লেন) সংযোগ সড়ক থেকে বানাতিপাড়া বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ।
- ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ।

খ। প্রকল্পের চলমান অঙ্গসমূহ

ক্র. নং	প্রকল্পের চলমান অঙ্গসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত)
১)	জেটি নির্মাণ (৬৫০ মিটার)	আর্থিক: ৬৮.২৯% বাস্তব: ৮৯%
২)	বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদি ও ইউটিলিটি সার্ভিস সহ ব্যাকআপ ইয়ার্ড নির্মাণ (৩.২৫ লক্ষ বর্গমিটার)	আর্থিক: ৭৫.৫১% বাস্তব: ৯০%
৩)	(৪+২ লেন) সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	আর্থিক: ৩৬.৩৫% বাস্তব: ৬০.৫০%
৪)	২টি টাগ বোট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।	আর্থিক: ২০% বাস্তব: ৭৪%
৫)	আন্ধারমানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণ	আর্থিক: ১০০% বাস্তব: ১০%
৬)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ডিজাইন, ড্রইং, প্রাক্কলন সম্পাদন।	আর্থিক: ৮০.৫২% বাস্তব: ৯৩%

➤ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ ভৌত – ৫৮.০৫%, আর্থিক- ১৯৮৮.৭৯ কোটি টাকা (৪৪.০৩%)

স.০৪.২০২৪
মোহাম্মদ আলী
মুখ্য পরিচালক (সি.এস.)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ছবি




ইয়ার্ড নির্মাণ

৩৭.০৪.২০১৪
মোহাম্মদ আলী
মুখ্য পরিচালনা প্রধান (কঃ দঃ)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



জেটি নির্মাণ

১৭.০৪.২০২৪
আলী
মুখ্য পরিচালক (জঃ দঃ)
স্বাধীনতা বন্দর কর্তৃপক্ষ

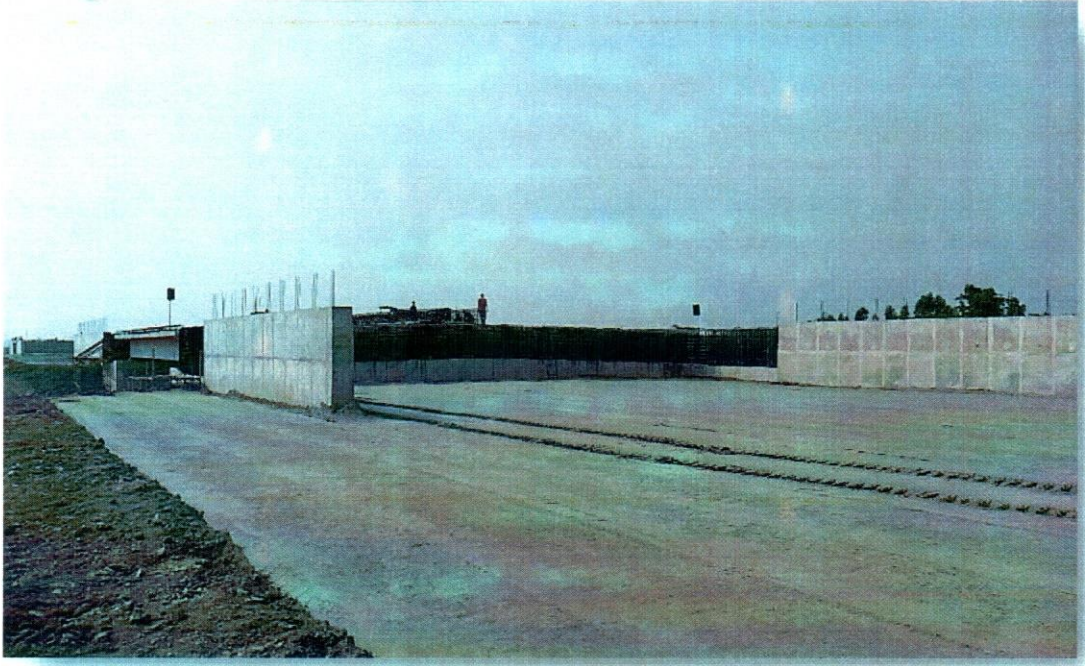

সংযোগ সড়ক (৪+২ লেন) নির্মাণ

১৭.০৪.২০২৪
মোঃ মাসুদ আলী
মুখ্য পরিদর্শন প্রকল্প (জি.৮৪)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


প্রকল্পের সমাপ্ত অঙ্গসমূহ



ওয়ার্ক বোট




সার্ভিস জেট

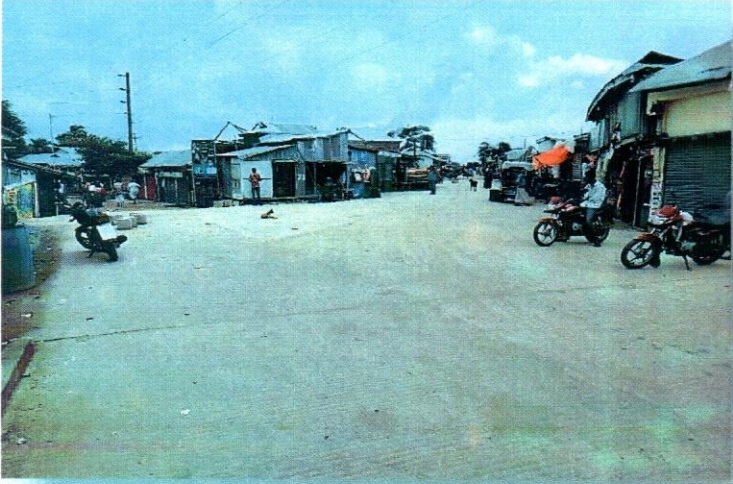

বানাতি বাজার রাস্তা



ডেইনেজ নেটওয়ার্ক


স.০৪.২০২৪
মোহাম্মদ আলী
মুখ্য প্রকৌশল প্রকৌশল (ডঃ এম)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
