



# পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

- প্রকল্পের নাম : পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/ সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
- বাস্তবায়ন মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৪
- মোট বরাদ্দ : ৪,৩৭৪.৪৭ কোটি টাকা

## ক। প্রকল্পের সমাপ্ত অঙ্গসমূহঃ

- ৪ লেন শেখ হাসিনা সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৫.২২ কি: মি:)
- জাহাজ নির্মাণ -৭টি (টাগ বোট-১টি, বয়ালেইং ভেসেল-১টি, জরিপ বোট-১টি, পাইলট ভেসেল-২টি, হেভী ডিউটি স্পিড বোট-২টি)
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ (৪,২০০ জন)
- ওয়্যার হাউজ নির্মাণ কাজ (১ লক্ষ বর্গফুট)।
- প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫ম তলা)
- অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে ড্রেজিং (৮০.১ মিলিয়ন ঘন মিটার)


## খ। প্রকল্পের চলমান অঙ্গসমূহ

ক্র. নং	প্রকল্পের চলমান অঙ্গসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত)
১)	ভূমি অধিগ্রহণ (৬৫৬২.২৭ একর)	আর্থিক: ৮০.৮৮% বাস্তব: ৮৭.০৫%
২)	ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসন (৩৪২৩টি পরিবার)	আর্থিক: ৮৯.০৯% বাস্তব: ৯৪.৬৩%
৩)	বন্দরের ডিটেইল মাস্টার প্ল্যান (২৫টি রিপোর্ট)	আর্থিক: ৮৯.১৪% বাস্তব: ৯৬.৪২%
৪)	কবর স্থানান্তর	মোট ৩৯১৫টির মধ্যে ৩৮১৪ টি কবর সুষ্ঠুভাবে স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে


➤ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ ভৌত – ৯২.৬০%, আর্থিক- ৩৭৮১.৮৪ কোটি টাকা (৮৬.৪৫%)


৩৭.০৪.২০২৪  
মোহাম্মদ আলী  
মুখ্য পরিচালক (অঃ দঃ)  
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ছবি

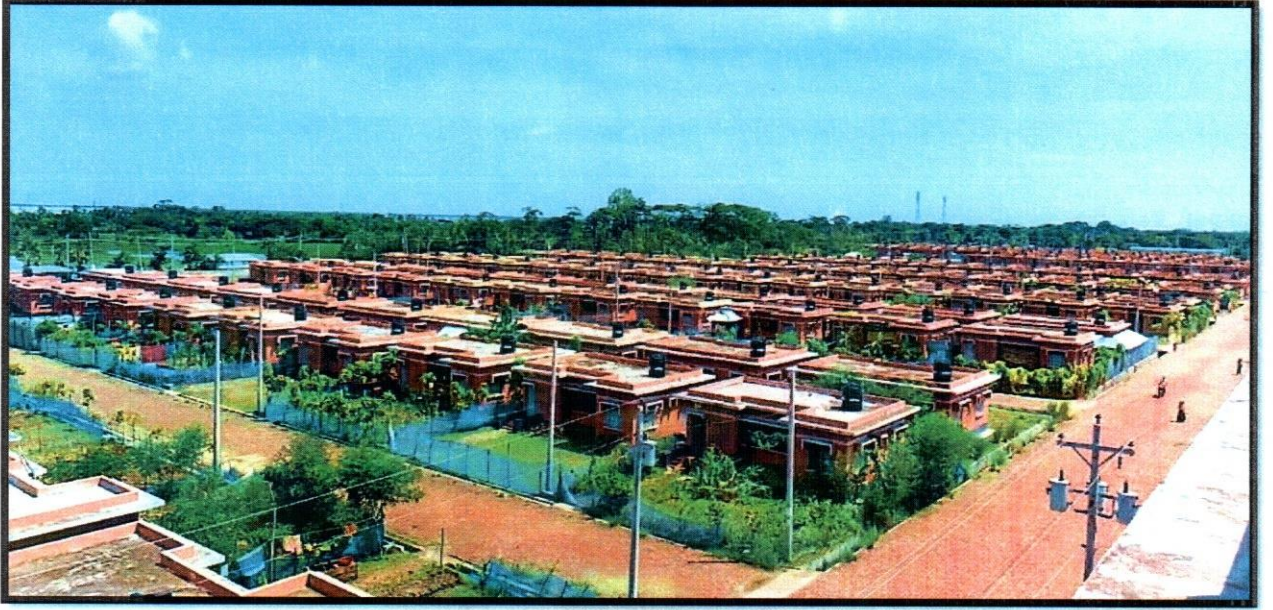

পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ

  
১৭.০৪.২০২৪  
মোহাম্মদ আলী  
মু. পরিচালনা প্রধান (সং. নং)  
দায়িত্ব বন্দর কর্তৃপক্ষ

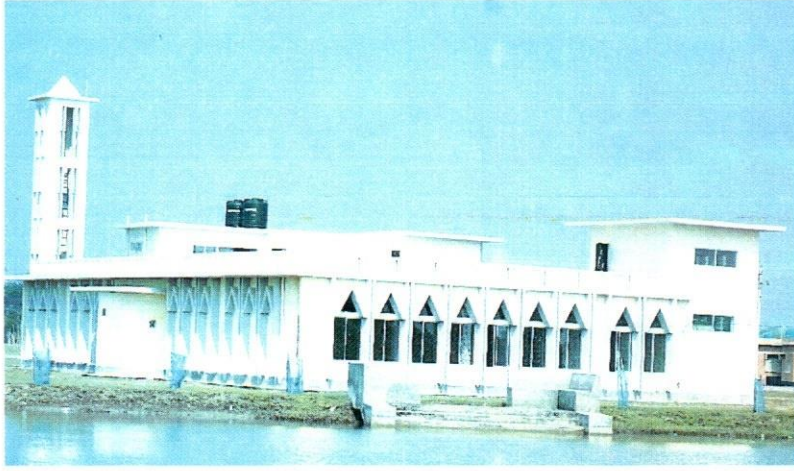


মসজিদ



স্কুল



মার্কেট

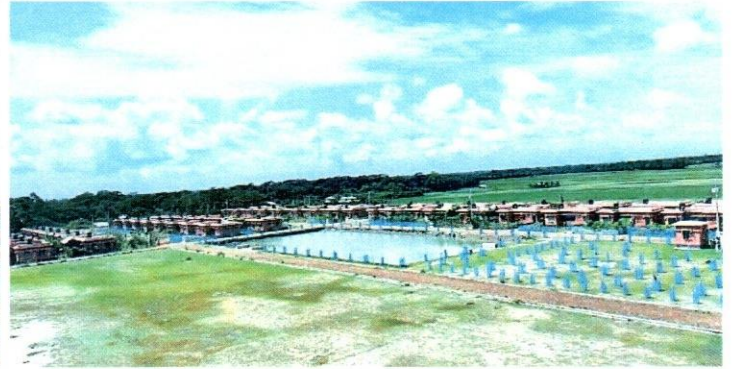

পুকুর

১৭.০৪.২০২৪  
মোঃ হাম্মাদ আলী  
মুঃ পরিচালনা প্রধান (সং দঃ)  
পার্বনা বঙ্গবন্ধু কর্তৃপক্ষ



কবর স্থানান্তর

১৭.০৪.২০২৪  
মোঃ মাহিদুল আলী  
মুঃ হাফিজুল ইসলাম (আঃ দাঃ)  
সার্বভৌম কবর কর্তৃপক্ষ

## সমাপ্ত অঙ্গসমূহ



## সংযোগ সড়ক

## জাহাজ নির্মাণ




## ক্রটিগ্রস্ত জনগণের প্রশিক্ষণ

## প্রশাসনিক ভবন

স্বাক্ষরিত  
১৯.০৪.২০২৪  
মোহাম্মদ আলী  
হুমু পরিচালনা প্রধান (অঃ পঃ)  
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রকল্পের সমাপ্ত অঙ্গসমূহ

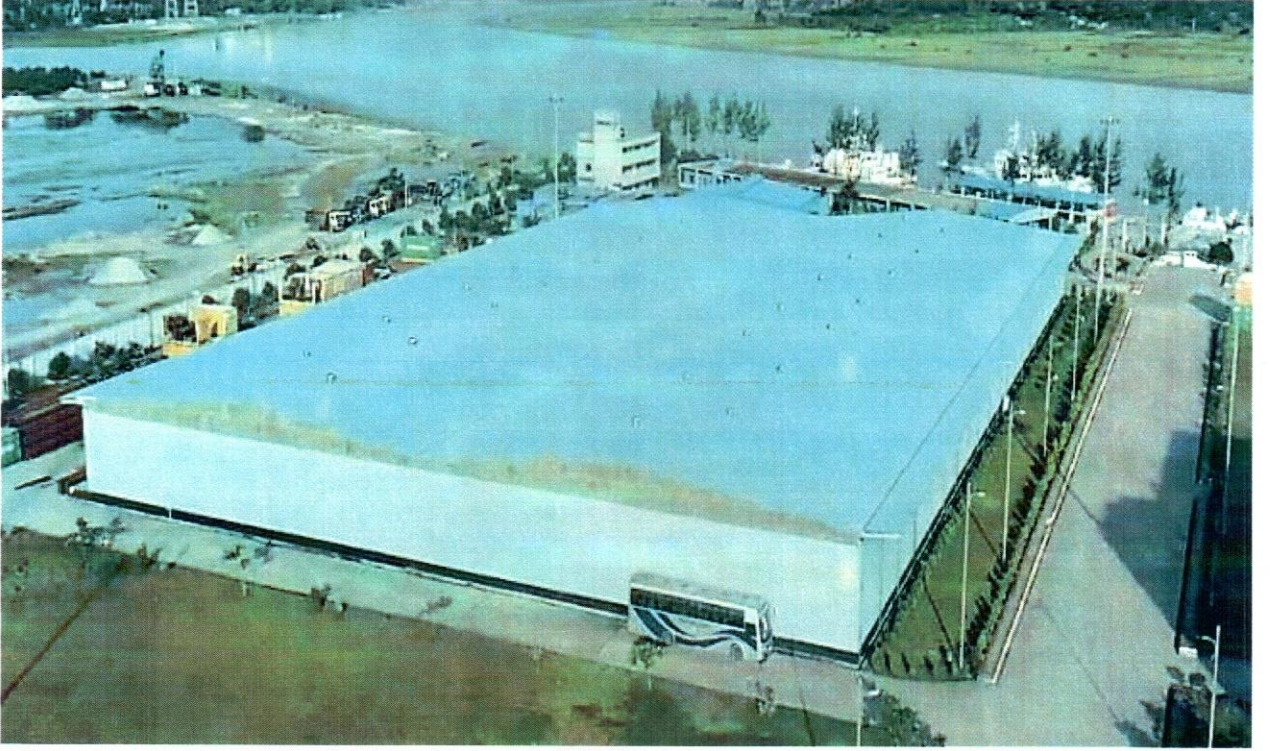

ওয়্যার হাউজ



অভ্যন্তরীণ নৌবুটে ডেজিং

১৭.০৪.২০২৪  
মোহাম্মদ আলী  
মুখ্য পরিচালক (সি.এস.সি.)  
স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু সড়ক
